獲得価値 - Program4

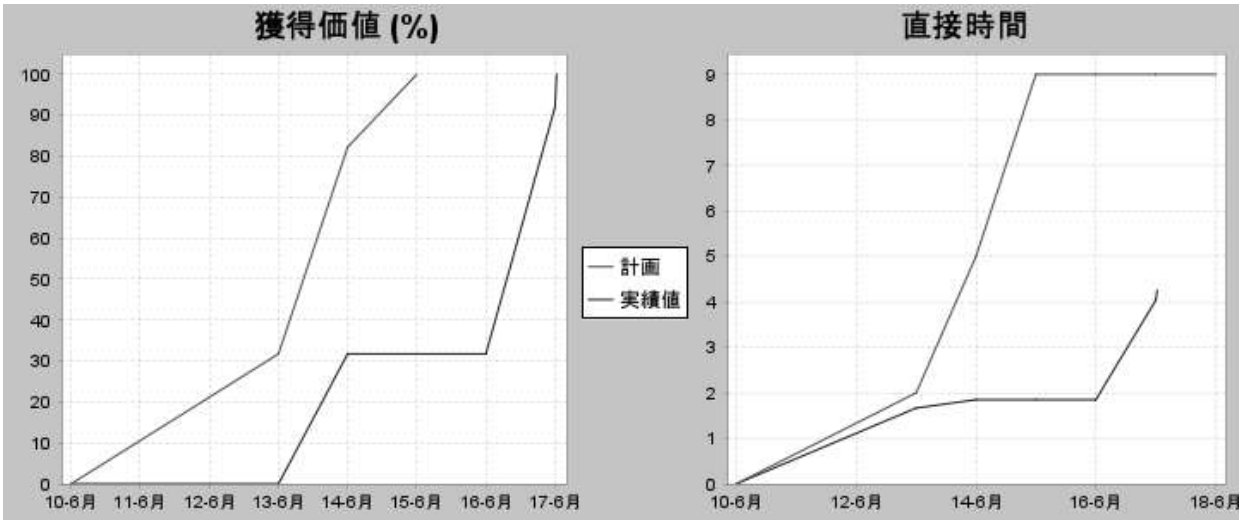

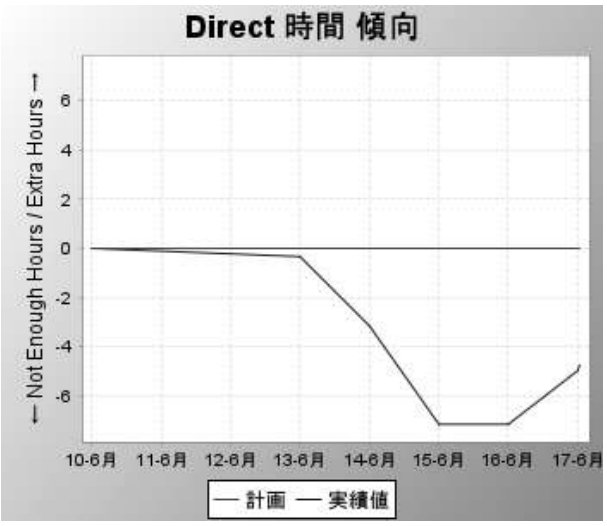

Planned Completion Date:	2025/06/14	*(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2025/06/14.)*
Replanned Completion Date:	2025/06/17	*(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your*

		original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2025/06/17.)
Replanned Cost:	4.25	*(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 4.25時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)*
コスト差異(CV):	1.323	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 1.32時間 少ない 作業工数が掛かりました。)*
コスト差異 (%CV):	24%	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 24% 少ない 作業工数が掛かりました。)*
コスト効率指数 (CPI):	1.311	*(計画に比べ少ない作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における1.311時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが大き過ぎたことを示します。)*
スケジュール差異(SV):	0	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、0分 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異 (%SV):	0%	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、0% 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異所要期間:	0	*(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは0分 前倒しです。)*
スケジュール効率指数(SPI):	1	*(スケジュールより早くタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、1時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、余裕がありすぎたことを意味するかもしれません。)*
完了率(%):	100%	*(全作業中の100%を完了しています。)*
経過率(%):	76%	*(全ての計画作業時間中 76% の作業時間が経過しました。)*
残作業の効率指標:	0	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における0時間の価値を達成しなければなりません。)*
改善率:	-1	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは100%少ない生産性でかまいません。)*
コスト予想:	4.25	*(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は4.25時間だと予想されます。)*
予想期間:	7.023	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は1.0週だと予想されます。)*
予想完了日:	2025/06/17	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2025/06/17に完了すると予想されます。)*

タスクリスト

プロジェクト/タスク	計画時間	実績時間	計画価値	計画完了日	Replan	予測	実績完了日	依存	完了率(%)	経過率(%)	獲得価値
Program4/Non Project/PSP for Engineers/Program4	5:34	4:15	100%	2025/06/14	2025/06/17	2025/06/17	2025/06/17		100%	76%	100%
Planning	1:46	1:51	31.7%	2025/06/12	2025/06/13	2025/06/13	2025/06/13		100%	105%	31.7%
Design	0:37	0:24	11.1%	2025/06/13	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16		100%	65%	11.1%
Code	1:54	0:50	34%	2025/06/13	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16		100%	44%	34%
Compile	0:18	0:12	5.4%	2025/06/13	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16		100%	67%	5.4%
Test	0:33	0:37	9.8%	2025/06/14	2025/06/16	2025/06/16	2025/06/16		100%	113%	9.8%

Postmortem	0:27	0:21	8%	2025/06/14	2025/06/17	2025/06/17	2025/06/17		100%	79%	8%

スケジュール

期間開始日	期間終了日	計画時間	累積計画時間	累積計画価値	実績時間	累積実績時間	獲得価値
2025/06/10	2025/06/12	2:00	2:00	31.7%	1:40	1:40	0%
2025/06/13	2025/06/13	3:00	5:00	82.2%	0:11	1:51	31.7%
2025/06/14	2025/06/14	4:00	9:00	100%	0:00	1:51	31.7%
2025/06/15	2025/06/15	0:00	9:00	100%	0:00	1:51	31.7%
2025/06/16	2025/06/16	0:00	9:00	100%	2:11	4:02	92%
2025/06/17	2025/06/17	0:00	9:00	100%	0:13	4:15	100%
