獲得価値 - prog5

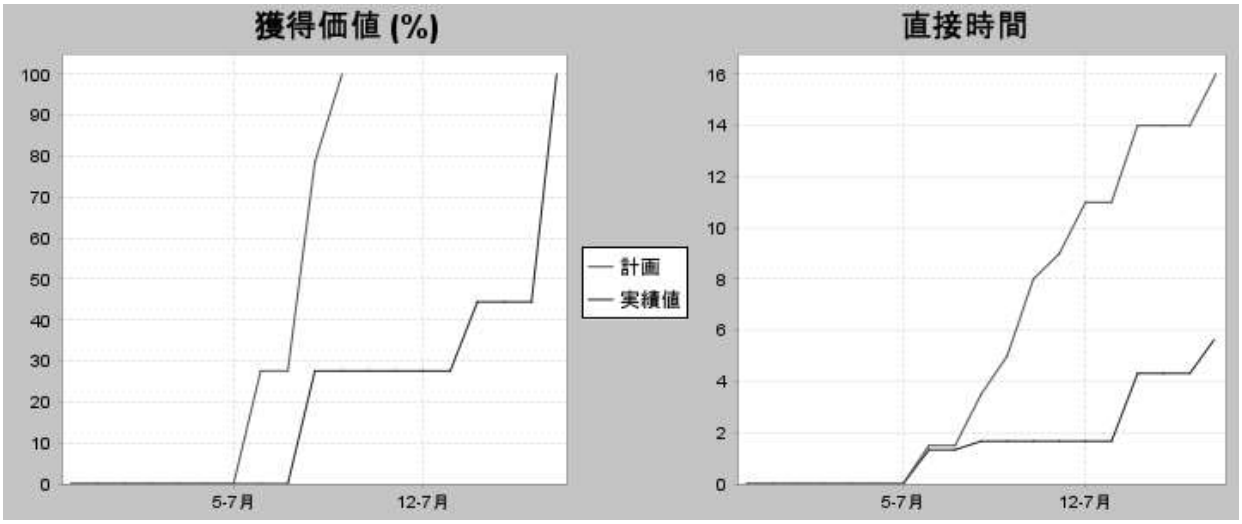

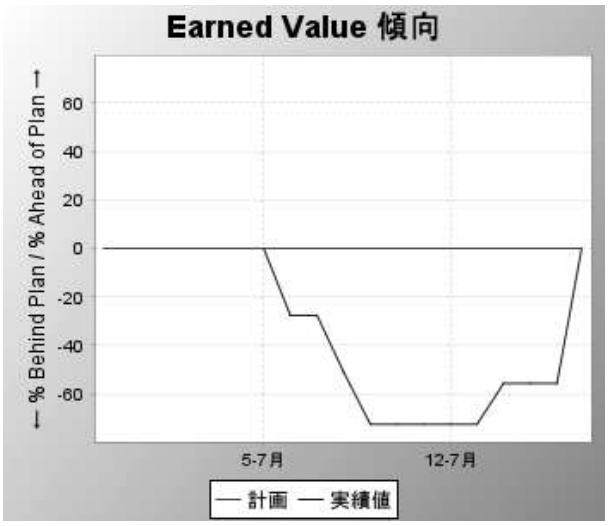

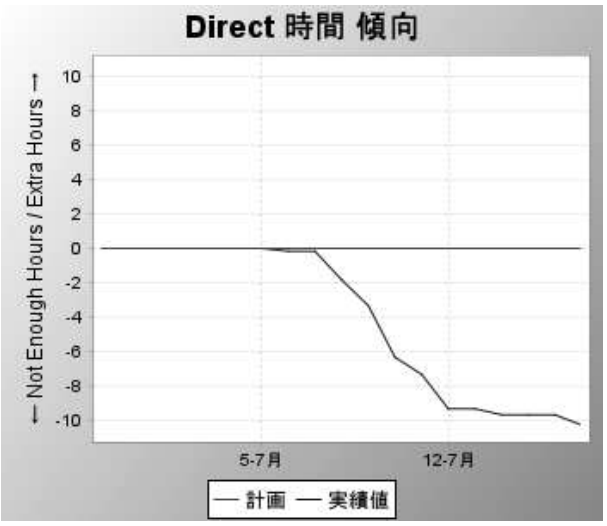

Planned Completion Date:	2025/07/08	*(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2025/07/08.)*
Replanned Completion Date:	2025/07/16	*(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your*

		original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2025/07/16.)
Replanned Cost:	5.617	*(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 5.62時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)*
コスト差異(CV):	-1.267	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 1.27時間 多くの 作業工数が掛かりました。)*
コスト差異(%CV):	-29%	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 29% 多くの 作業工数が掛かりました。)*
コスト効率指数(CPI):	0.774	*(計画に比べ多くの作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における0.774時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが小さ過ぎたことを示します。)*
スケジュール差異(SV):	0	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、0分 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異 (%SV):	0%	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、0% 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異所要期間:	0	*(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは0分 前倒しです。)*
スケジュール効率指数(SPI):	1	*(スケジュールより早くタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、1時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、余裕がありすぎたことを意味するかもしれません。)*
完了率(%):	100%	*(全作業中の100%を完了しています。)*
経過率(%):	129%	*(全ての計画作業時間中 129% の作業時間が経過しました。)*
残作業の効率指標:	-0	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における-0時間の価値を達成しなければなりません。)*
改善率:	-1	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは100%少ない生産性でかまいません。)*
コスト予想:	5.617	*(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は5.62時間だと予想されます。)*
予想期間:	17.925	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は2.56週だと予想されます。)*
予想完了日:	2025/07/16	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2025/07/16に完了すると予想されます。)*

タスクリスト

プロジェクト/タスク	計画時間	実績時間	計画価値	計画完了日	Replan	予測	実績完了日	依存	完了率(%)	経過率(%)	獲得価値
prog5/Non Project/PSP for Engineers/Program 5	4:21	5:37	100%	2025/07/08	2025/07/16	2025/07/16	2025/07/16		100%	129%	100%
Planning	1:12	1:40	27.6%	2025/07/05	2025/07/07	2025/07/07	2025/07/07		100%	139%	27.6%
Design	0:24	0:37	9.2%	2025/07/07	2025/07/13	2025/07/13	2025/07/13		100%	154%	9.2%
Design Review	0:20	0:28	7.7%	2025/07/07	2025/07/13	2025/07/13	2025/07/13		100%	140%	7.7%
Code	1:09	1:47	26.4%	2025/07/07	2025/07/16	2025/07/16	2025/07/16		100%	155%	26.4%
Code Review	0:20	0:28	7.7%	2025/07/07	2025/07/16	2025/07/16	2025/07/16		100%	140%	7.7%

Compile	0:11	0:00	4.2%	2025/07/08	2025/07/16	2025/07/16	2025/07/16		100%		4.2%
Test	0:20	0:03	7.5%	2025/07/08	2025/07/16	2025/07/16	2025/07/16		100%	15%	7.5%
Postmortem	0:25	0:34	9.7%	2025/07/08	2025/07/16	2025/07/16	2025/07/16		100%	134%	9.7%

スケジュール

期間開始日	期間終了日	計画時間	累積計画時間	累積計画価値	実績時間	累積実績時間	獲得価値
2025/06/29	2025/06/29	0:00	0:00	0%	0:00	0:00	0%
2025/06/30	2025/06/30	0:00	0:00	0%	0:00	0:00	0%
2025/07/01	2025/07/01	0:00	0:00	0%	0:00	0:00	0%
2025/07/02	2025/07/02	0:00	0:00	0%	0:00	0:00	0%
2025/07/03	2025/07/03	0:00	0:00	0%	0:00	0:00	0%
2025/07/04	2025/07/04	0:00	0:00	0%	0:00	0:00	0%
2025/07/05	2025/07/05	1:30	1:30	27.6%	1:20	1:20	0%
2025/07/06	2025/07/06	0:00	1:30	27.6%	0:00	1:20	0%
2025/07/07	2025/07/07	2:00	3:30	78.5%	0:20	1:40	27.6%
2025/07/08	2025/07/08	1:30	5:00	100%	0:00	1:40	27.6%
2025/07/09	2025/07/09	3:00	8:00	100%	0:00	1:40	27.6%
2025/07/10	2025/07/10	1:00	9:00	100%	0:00	1:40	27.6%
2025/07/11	2025/07/11	2:00	11:00	100%	0:00	1:40	27.6%
2025/07/12	2025/07/12	0:00	11:00	100%	0:00	1:40	27.6%
2025/07/13	2025/07/13	3:00	14:00	100%	2:39	4:19	44.4%
2025/07/14	2025/07/14	0:00	14:00	100%	0:00	4:19	44.4%
2025/07/15	2025/07/15	0:00	14:00	100%	0:00	4:19	44.4%
2025/07/16	2025/07/16	2:00	16:00	100%	1:18	5:37	100%
