# 獲得価値 - prog5

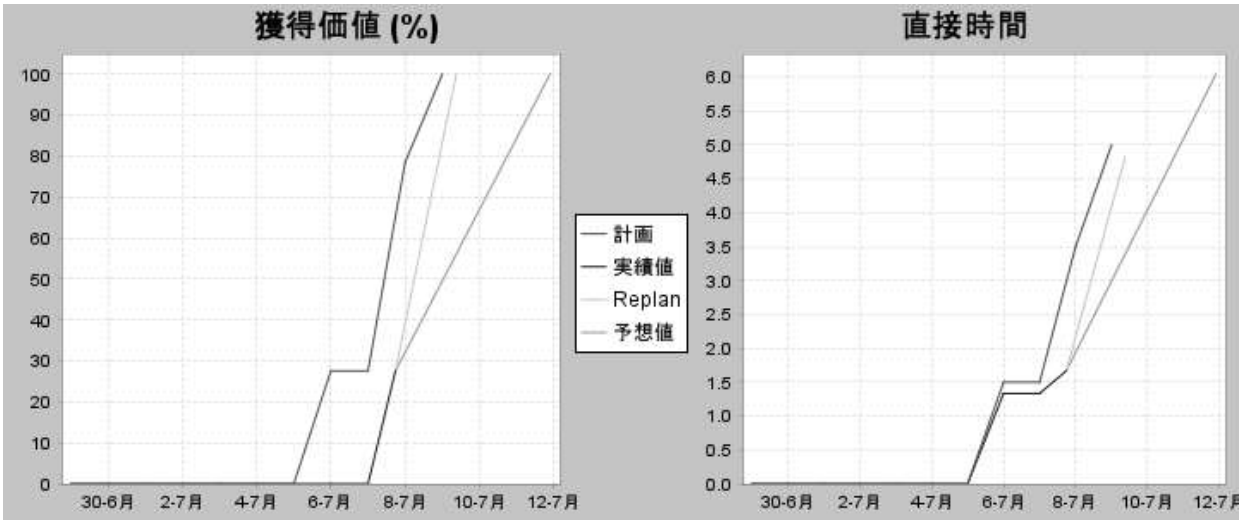


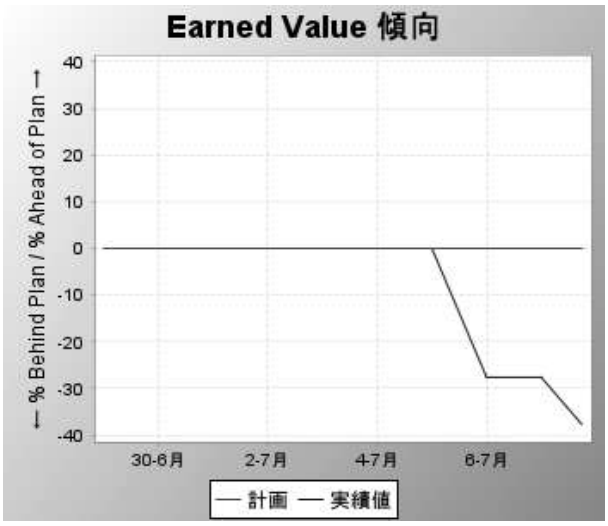


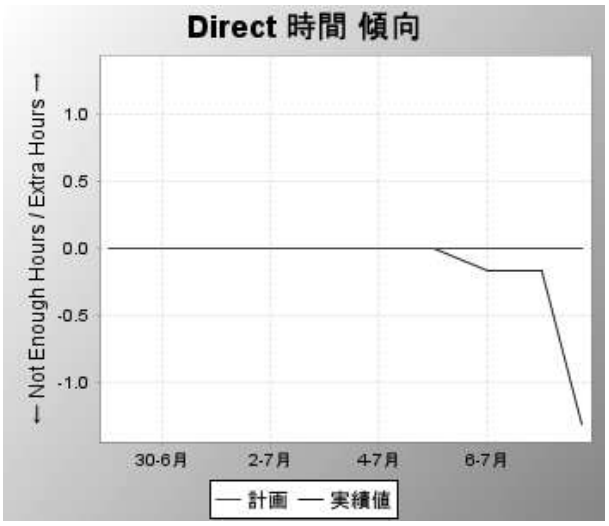

| | | |
|---|---|---|
| **Planned Completion Date:** | 2025/07/08 | *(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2025/07/08.)* |
| **Replanned Completion Date:** | 2025/07/09 | *(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2025/07/09.)* |
| **Replanned Cost:** | 4.817 | *(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 4.82時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)* |
| **コスト差異(CV):** | -0.467 | *(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 28分 多くの 作業工数が掛かりました。)* |
| **コスト差異(%CV):** | -39% | *(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 39% 多くの 作業工数が掛かりました。)* |
| **コスト効率指数(CPI):** | 0.72 | *(計画に比べ多くの作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における0.72時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが小さ過ぎたことを示します。)* |
| **スケジュール差異(SV):** | -1.638 | *(今日までに完了していると計画した作業に比べ、1.64時間 少ない 作業が完了しています。)* |
| **スケジュール差異 (%SV):** | -58% | *(今日までに完了していると計画した作業に比べ、58% 少ない 作業が完了しています。)* |
| **スケジュール差異所要期間:** | -11.929 | *(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは1.7週 遅延しています。)* |
| **スケジュール効率指数(SPI):** | 0.423 | *(スケジュールより送れてタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、0.423時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、挑戦的すぎたことを意味するかもしれません。)* |
| **完了率(%):** | 28% | *(全作業中の28%を完了しています。)* |
| **経過率(%):** | 38% | *(全ての計画作業時間中 38% の作業時間が経過しました。)* |
| **残作業の効率指標:** | 1.174 | *(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における1.174時間の価値を達成しなければなりません。)* |
| **改善率:** | 0.63 | *(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは63%多くの生産性でなければなりません。)* |
| **コスト予想:** | 6.042 | *(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は6.04時間だと予想されます。)* |
| **予想期間:** | 12.897 | *(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は1.84週だと予想されます。)* |
| **予想完了日:** | 2025/07/11 | *(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2025/07/11に完了すると予想されます。)* |

# タスクリスト

| プロジェクト/タスク | 計画時間 | 実績時間 | 計画価値 | 計画完了日 | Replan | 予測 | 実績完了日 | 依存 | 完了率(%) | 経過率(%) | 獲得価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prog5/Non Project/PSP for Engineers/Program 5 | 4:21 | 1:40 | 100% | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/11 | | | 28% | 38% | 27.6% |
| Planning | 1:12 | 1:40 | 27.6% | 2025/07/05 | 2025/07/07 | 2025/07/07 | 2025/07/07 | | 100% | 139% | 27.6% |
| Design | 0:24 | 0:00 | 9.2% | 2025/07/07 | 2025/07/07 | 2025/07/08 | | | | | |
| Design Review | 0:20 | 0:00 | 7.7% | 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/08 | | | | | |
| Code | 1:09 | 0:00 | 26.4% | 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | | | | | |
| Code Review | 0:20 | 0:00 | 7.7% | 2025/07/07 | 2025/07/09 | 2025/07/10 | | | | | |
| Compile | 0:11 | 0:00 | 4.2% | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 0:20 | 0:00 | 7.5% | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/11 | | | | | |
| Postmortem | 0:25 | 0:00 | 9.7% | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/11 | | | | | |

## スケジュール

| 期間開始日 | 期間終了日 | 計画時間 | 累積計画時間 | 累積計画価値 | 実績時間 | 累積実績時間 | 獲得価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 | 2025/06/29 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0:00 | 0% |
| 2025/06/30 | 2025/06/30 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0:00 | 0% |
| 2025/07/01 | 2025/07/01 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0:00 | 0% |
| 2025/07/02 | 2025/07/02 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0:00 | 0% |
| 2025/07/03 | 2025/07/03 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0:00 | 0% |
| 2025/07/04 | 2025/07/04 | 0:00 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0:00 | 0% |
| 2025/07/05 | 2025/07/05 | 1:30 | 1:30 | 27.6% | 1:20 | 1:20 | 0% |
| 2025/07/06 | 2025/07/06 | 0:00 | 1:30 | 27.6% | 0:00 | 1:20 | 0% |
| 2025/07/07 | 2025/07/07 | 2:00 | 3:30 | 78.5% | 0:20 | 1:40 | 27.6% |
| 2025/07/08 | 2025/07/08 | 1:30 | 5:00 | 100% | 0:00 | 1:40 | 27.6% |
| 2025/07/09 | 2025/07/09 | 3:00 | 8:00 | 100% | 0:00 | 1:40 | 27.6% |
| 2025/07/10 | 2025/07/10 | 1:00 | 9:00 | 100% | 0:00 | 1:40 | 27.6% |
| 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2:00 | 11:00 | 100% | 0:00 | 1:40 | 27.6% |
