獲得価値 - Program6

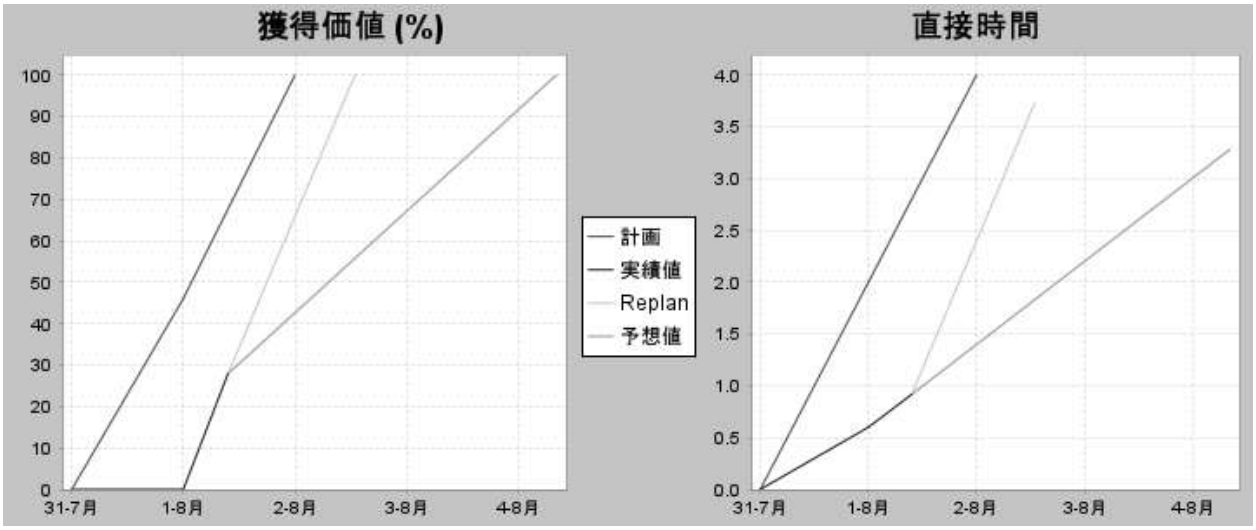

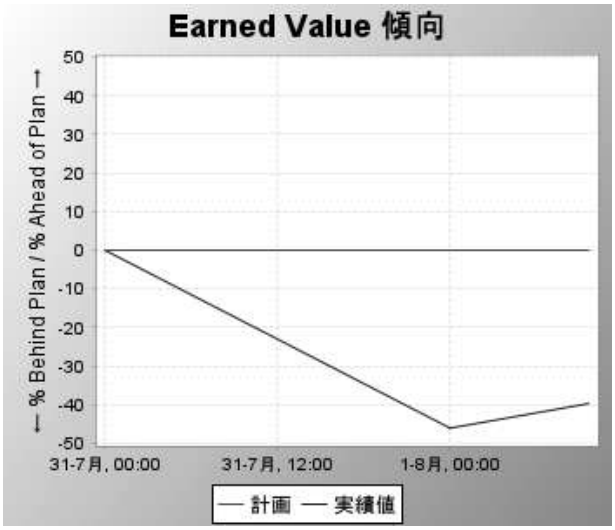

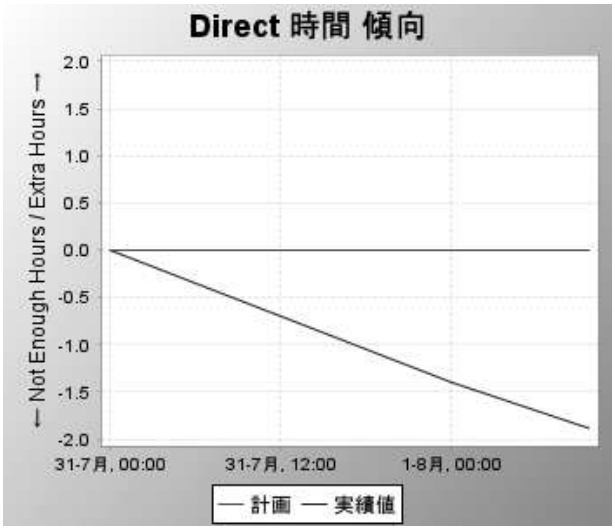

Planned Completion Date:	2025/08/01	*(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2025/08/01.)*
Replanned Completion	2025/08/02	*(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your*

Date:		*original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2025/08/02.)*
Replanned Cost:	3.73	*(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 3.73 時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)*
コスト差異(CV):	0.174	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 10.4分 少ない 作業工数が掛かりました。)*
コスト差異 (%CV):	16%	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 16% 少ない 作業工数が掛かりました。)*
コスト効率指数 (CPI):	1.19	*(計画に比べ少ない作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における1.19時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが大き過ぎたことを示します。)*
スケジュール差異(SV):	-1.551	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、1.55時間 少ない 作業が完了しています。)*
スケジュール差異 (%SV):	-59%	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、59% 少ない 作業が完了しています。)*
スケジュール差異所要期間:	-1.992	*(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは1.99 日 遅延しています。)*
スケジュール効率指数(SPI):	0.413	*(スケジュールより送れてタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、0.413時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、挑戦的すぎたことを意味するかもしれません。)*
完了率(%):	28%	*(全作業中の28%を完了しています。)*
経過率(%):	23%	*(全ての計画作業時間中 23% の作業時間が経過しました。)*
残作業の効率指標:	0.942	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における0.942時間の価値を達成しなければなりません。)*
改善率:	-0.208	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは21%少ない生産性でかまいません。)*
コスト予想:	3.282	*(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は3.28時間だと予想されます。)*
予想期間:	4.342	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は4.34 日だと予想されます。)*
予想完了日:	2025/08/04	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2025/08/04に完了すると予想されます。)*

タスクリスト

プロジェクト/タスク	計画時間	実績時間	計画価値	計画完了日	Replan	予測	実績完了日	依存	完了率(%)	経過率(%)	獲得価値
Program6/Non Project/PSP for Engineers/Program6	3:54	0:55	100%	2025/08/01	2025/08/02	2025/08/04			28%	23%	27.9%
Planning	1:05	0:55	27.9%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/01	2025/08/01		100%	84%	27.9%
Design	0:24	0:00	10.3%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/01					
Design Review	0:18	0:00	7.8%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/02					
Code	1:10	0:00	29.9%	2025/08/01	2025/08/02	2025/08/03					
Code Review	0:18	0:00	7.8%	2025/08/01	2025/08/02	2025/08/03					

Compile	0:00	0:00	0%	2025/08/01	2025/08/02	2025/08/03					
Test	0:02	0:00	0.8%	2025/08/01	2025/08/02	2025/08/03					
Postmortem	0:36	0:00	15.4%	2025/08/01	2025/08/02	2025/08/04					

スケジュール

期間開始日	期間終了日	計画時間	累積計画時間	累積計画価値	実績時間	累積実績時間	獲得価値
2025/07/31	2025/07/31	2:00	2:00	46.1%	0:36	0:36	0%
2025/08/01	2025/08/01	2:00	4:00	100%	0:19	0:55	27.9%
2025/08/02	2025/08/02	3:00	7:00	100%	0:00	0:55	27.9%
2025/08/03	2025/08/03	2:00	9:00	100%	0:00	0:55	27.9%
2025/08/04	2025/08/04	3:00	12:00	100%	0:00	0:55	27.9%
