獲得価値 - Program6

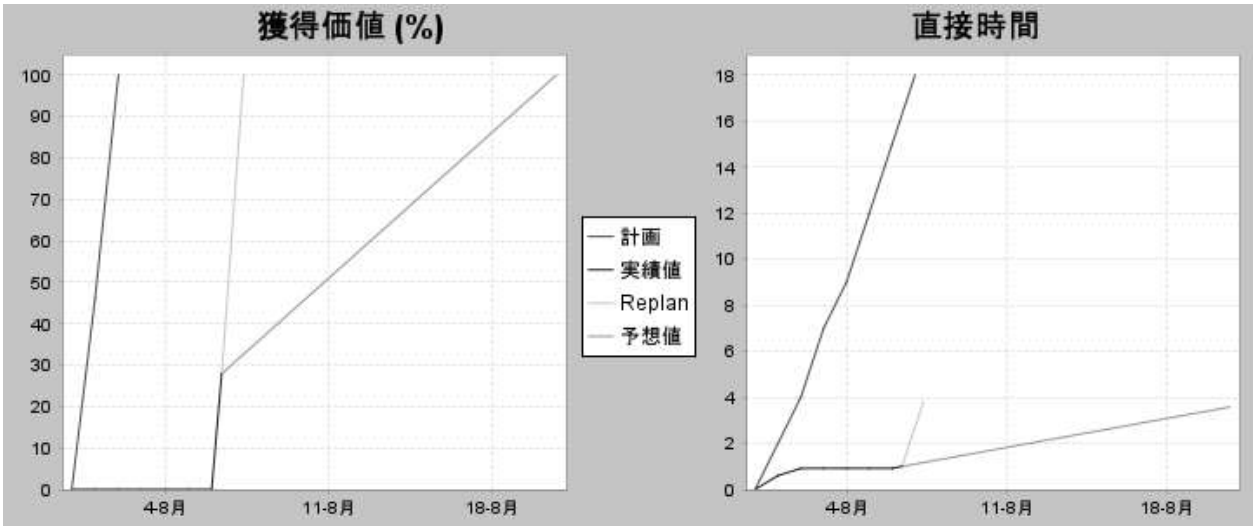

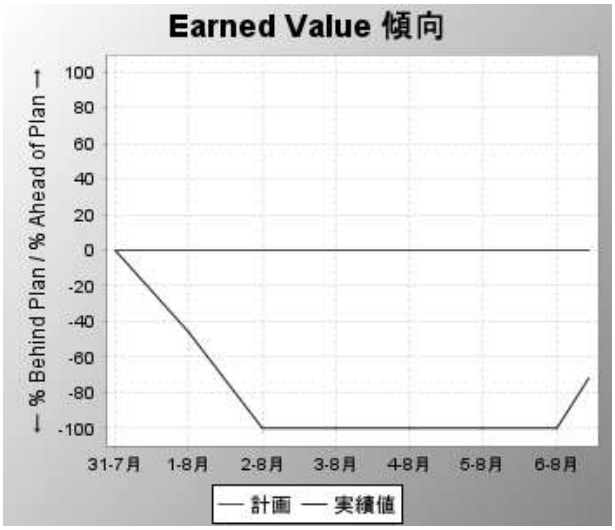

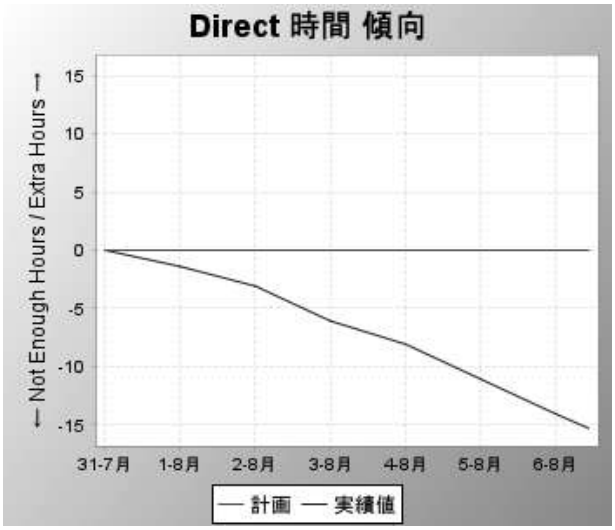

Planned Completion Date:	2025/08/01	*(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2025/08/01.)*
Replanned Completion	2025/08/07	*(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your*

Date:		*original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2025/08/07.)*
Replanned Cost:	3.813	*(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 3.81 時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)*
コスト差異(CV):	0.09	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 5.42分 少ない 作業工数が掛かりました。)*
コスト差異 (%CV):	8%	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 8% 少ない 作業工数が掛かりました。)*
コスト効率指数 (CPI):	1.09	*(計画に比べ少ない作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における1.09時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが大き過ぎたことを示します。)*
スケジュール差異(SV):	-2.813	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、2.81時間 少ない 作業が完了しています。)*
スケジュール差異 (%SV):	-72%	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、72% 少ない 作業が完了しています。)*
スケジュール差異所要期間:	-16.593	*(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは2.37週 遅延しています。)*
スケジュール効率指数(SPI):	0.279	*(スケジュールより送れてタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、0.279時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、挑戦的すぎたことを意味するかもしれません。)*
完了率(%):	28%	*(全作業中の28%を完了しています。)*
経過率(%):	26%	*(全ての計画作業時間中 26% の作業時間が経過しました。)*
残作業の効率指標:	0.969	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における0.969時間の価値を達成しなければなりません。)*
改善率:	-0.111	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは11%少ない生産性でかまいません。)*
コスト予想:	3.58	*(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は3.58時間だと予想されます。)*
予想期間:	20.778	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は2.97週だと予想されます。)*
予想完了日:	2025/08/20	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2025/08/20に完了すると予想されます。)*

タスクリスト

プロジェクト/タスク	計画時間	実績時間	計画価値	計画完了日	Replan	予測	実績完了日	依存	完了率(%)	経過率(%)	獲得価値
Program6/Non Project/PSP for Engineers/Program6	3:54	1:00	100%	2025/08/01	2025/08/07	2025/08/20			28%	26%	27.9%
Planning	1:05	1:00	27.9%	2025/07/31	2025/08/06	2025/08/06	2025/08/06		100%	92%	27.9%
Design	0:24	0:00	10.3%	2025/07/31	2025/08/06	2025/08/08					
Design Review	0:18	0:00	7.8%	2025/07/31	2025/08/06	2025/08/10					
Code	1:10	0:00	29.9%	2025/08/01	2025/08/07	2025/08/16					
Code Review	0:18	0:00	7.8%	2025/08/01	2025/08/07	2025/08/17					

Compile	0:00	0:00	0%	2025/08/01	2025/08/07	2025/08/17					
Test	0:02	0:00	0.8%	2025/08/01	2025/08/07	2025/08/17					
Postmortem	0:36	0:00	15.4%	2025/08/01	2025/08/07	2025/08/20					

スケジュール

期間開始日	期間終了日	計画時間	累積計画時間	累積計画価値	実績時間	累積実績時間	獲得価値
2025/07/31	2025/07/31	2:00	2:00	46.1%	0:36	0:36	0%
2025/08/01	2025/08/01	2:00	4:00	100%	0:19	0:55	0%
2025/08/02	2025/08/02	3:00	7:00	100%	0:00	0:55	0%
2025/08/03	2025/08/03	2:00	9:00	100%	0:00	0:55	0%
2025/08/04	2025/08/04	3:00	12:00	100%	0:00	0:55	0%
2025/08/05	2025/08/05	3:00	15:00	100%	0:00	0:55	0%
2025/08/06	2025/08/06	3:00	18:00	100%	0:05	1:00	27.9%
2025/08/07	2025/08/07	3:00	21:00	100%	0:00	1:00	27.9%
2025/08/08	2025/08/08	2:00	23:00	100%	0:00	1:00	27.9%
2025/08/09	2025/08/09	3:00	26:00	100%	0:00	1:00	27.9%
