獲得価値 - Program7

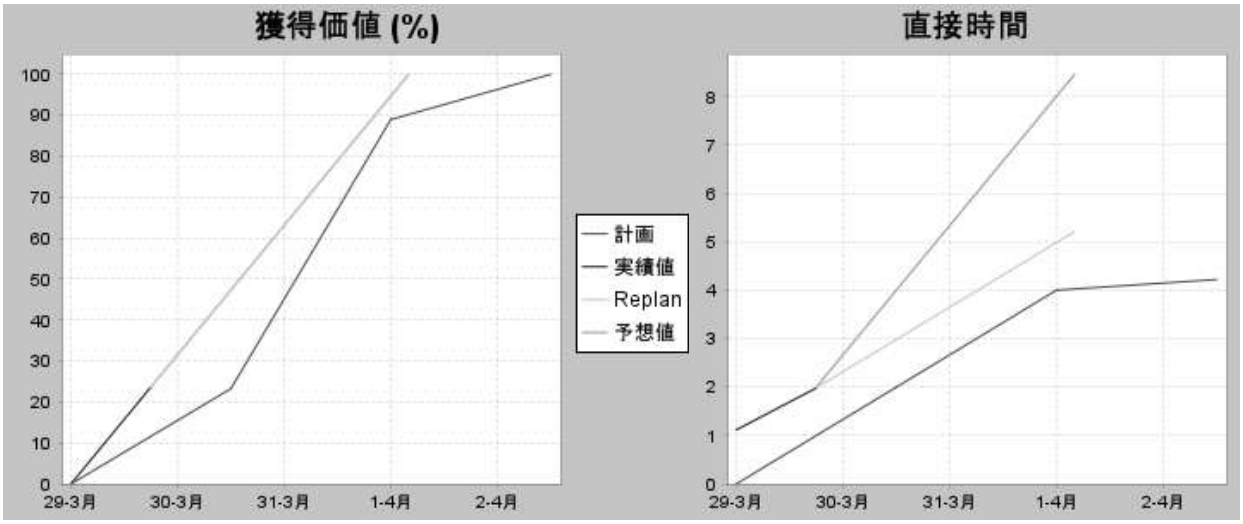

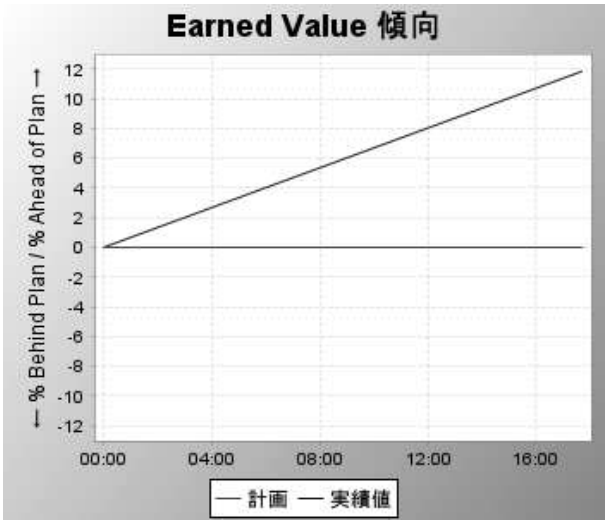

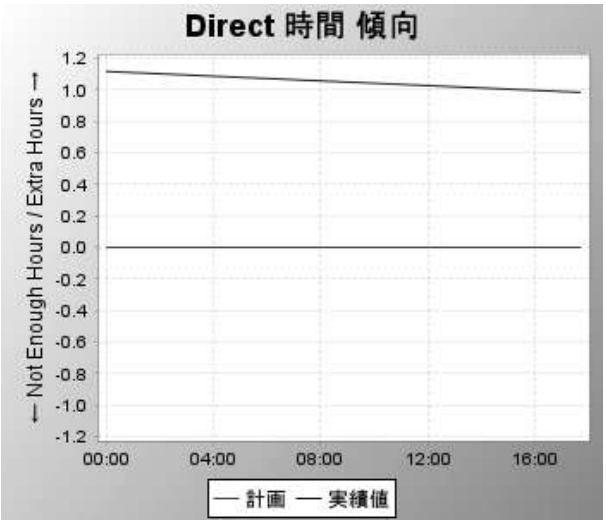

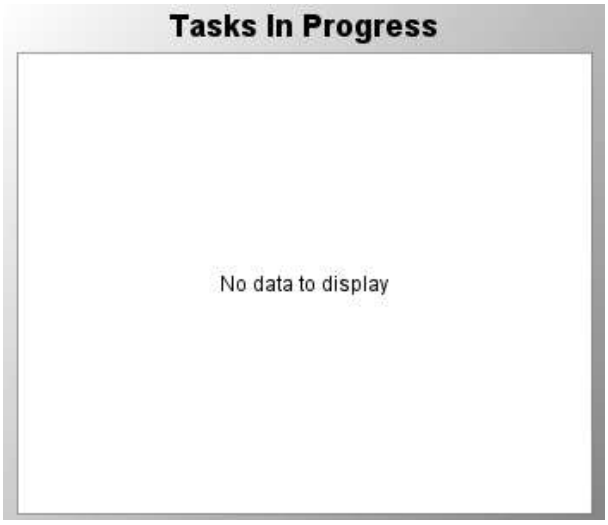

Planned Completion Date:	2026/04/02	*(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2026/04/02.)*
Replanned Completion Date:	2026/04/01	*(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your*

		original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2026/04/01.)
Replanned Cost:	5.205	*(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 5.2時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)*
コスト差異(CV):	-0.985	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 59.1分 多くの 作業工数が掛かりました。)*
コスト差異 (%CV):	-100%	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 100% 多くの 作業工数が掛かりました。)*
コスト効率指数 (CPI):	0.499	*(計画に比べ多くの作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における0.499時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが小さ過ぎたことを示します。)*
スケジュール差異(SV):	0.499	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、30.0分 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異 (%SV):	104%	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、104% 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異所要期間:	0.375	*(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは9.0時間 前倒しです。)*
スケジュール効率指数(SPI):	2.036	*(スケジュールより早くタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、2.036時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、余裕がありすぎたことを意味するかもしれません。)*
完了率(%):	23%	*(全作業中の23%を完了しています。)*
経過率(%):	47%	*(全ての計画作業時間中 47% の作業時間が経過しました。)*
残作業の効率指標:	1.437	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における1.437時間の価値を達成しなければなりません。)*
改善率:	1.881	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは188%多くの生産性でなければなりません。)*
コスト予想:	8.457	*(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は8.46時間だと予想されます。)*
予想期間:	3.168	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は3.17 日だと予想されます。)*
予想完了日:	2026/04/01	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2026/04/01に完了すると予想されます。)*

タスクリスト

プロジェクト/タスク	計画時間	実績時間	計画価値	計画完了日	Replan	予測	実績完了日	依存	完了率(%)	経過率(%)	獲得価値
Program7/Non Project/PSP for Engineers/Program 7	4:13	1:58	100%	2026/04/02	2026/04/01	2026/04/01			23%	47%	23.3%
Planning	0:59	1:58	23.3%	2026/03/30	2026/03/29	2026/03/29	2026/03/29		100%	200%	23.3%
Design	1:03	0:00	25%	2026/03/31	2026/03/30	2026/03/30					
Design Review	0:19	0:00	7.6%	2026/03/31	2026/03/30	2026/03/30					
Code	1:02	0:00	24.4%	2026/03/31	2026/03/31	2026/03/31					
Code Review	0:17	0:00	6.7%	2026/03/31	2026/03/31	2026/03/31					
Compile	0:02	0:00	0.7%	2026/03/31	2026/03/31	2026/03/31					

Test	0:03	0:00	1.3%	2026/03/31	2026/03/31	2026/03/31					
Postmortem	0:28	0:00	11%	2026/04/02	2026/04/01	2026/04/01					

スケジュール

期間開始日	期間終了日	計画時間	累積計画時間	累積計画価値	実績時間	累積実績時間	獲得価値
2026/03/29	2026/03/30	2:00	2:00	23.3%	0:51	1:58	23.3%
2026/03/30	2026/03/31	2:00	4:00	89%	0:00	1:58	23.3%
2026/03/31	2026/04/02	0:13	4:13	100%	0:00	1:58	23.3%
