獲得価値 - Program7

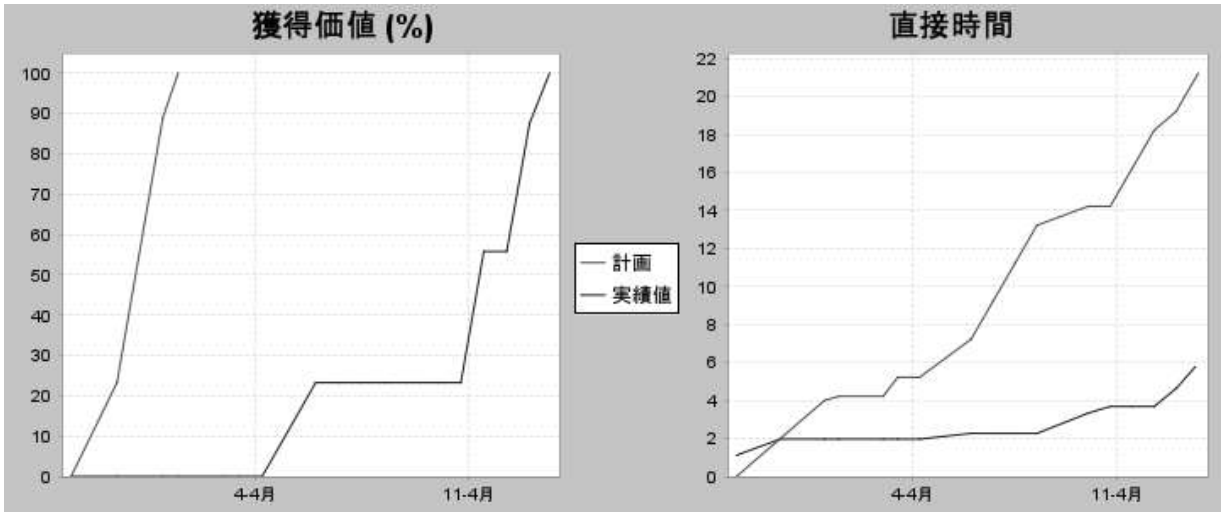

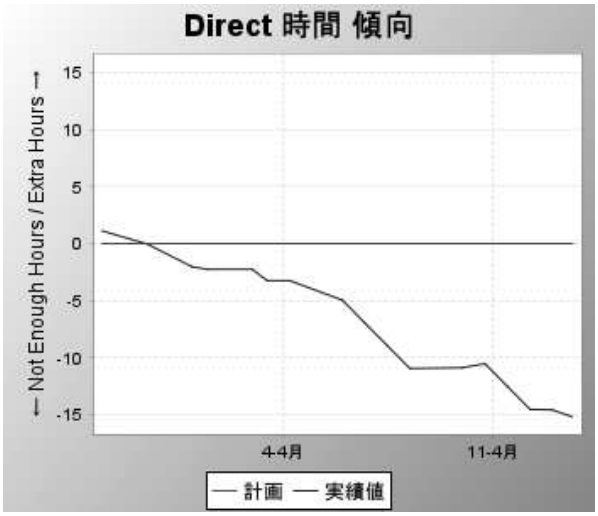

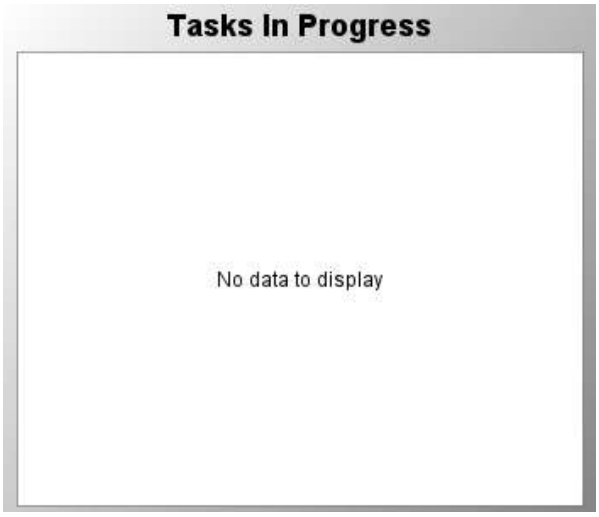

Planned Completion Date:	2026/04/01	*(Based upon the planned time for each task and the planned time in your schedule, you plan to complete the work by 2026/04/01.)*
Replanned Completion Date:	2026/04/13	*(If you were to "replan from today," taking into account the amount of time your actual progress has slipped against your original plan, but assuming that your original planned times still hold true for all remaining tasks and time periods, the replanned completion date for the overall work would be 2026/04/13.)*

Replanned Cost:	5.767	*(Based on your current cost variance, the total work is projected to require 5.77時間 of effort if remaining tasks take exactly as much time as planned.)*
コスト差異(CV):	-1.547	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 1.55時間 多くの 作業工数が掛かりました。)*
コスト差異(%CV):	-37%	*(現在までに 完了したタスクは計画に比べ 37% 多くの 作業工数が掛かりました。)*
コスト効率指数(CPI):	0.732	*(計画に比べ多くの作業工数が掛かりました。実績作業時間１時間あたり、計画における0.732時間の価値を達成しています。これは通常、当初の作業時間見積もりが小さ過ぎたことを示します。)*
スケジュール差異(SV):	0	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、0分 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異 (%SV):	0%	*(今日までに完了していると計画した作業に比べ、0% 多くの 作業が完了しています。)*
スケジュール差異所要期間:	0	*(現在までのタスクの完了率からすると、スケジュールは0分 前倒しです。)*
スケジュール効率指数(SPI):	1	*(スケジュールより早くタスクが完了しています。今までに達成しているべき作業１時間あたり、1時間の作業が完了しています。これは当初のスケジュール計画が、余裕がありすぎたことを意味するかもしれません。)*
完了率(%):	100%	*(全作業中の100%を完了しています。)*
経過率(%):	137%	*(全ての計画作業時間中 137% の作業時間が経過しました。)*
残作業の効率指標:	-0	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、これから１時間あたりに計画時における-0時間の価値を達成しなければなりません。)*
改善率:	-1	*(当初の見積もり工数の範囲内で全ての作業を完了するためには、今までの生産性に比べ、これからは100%少ない生産性でかまいません。)*
コスト予想:	5.767	*(現在のCPIから、全ての作業に必要な工数は5.77時間だと予想されます。)*
予想期間:	15.65	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業期間は2.24週だと予想されます。)*
予想完了日:	2026/04/13	*(現在までのタスクの達成率より、全ての作業は2026/04/13に完了すると予想されます。)*

タスクリスト

プロジェクト/タスク	計画時間	実績時間	計画価値	計画完了日	Replan	予測	実績完了日	依存	完了率(%)	経過率(%)	獲得価値
Program7/Non Project/PSP for Engineers/Program7	4:13	5:46	100%	2026/04/01	2026/04/13	2026/04/13	2026/04/13		100%	137%	100%
Planning	0:59	2:16	23.3%	2026/03/30	2026/04/04	2026/04/04	2026/04/04		100%	231%	23.3%
Design	1:03	1:04	25%	2026/03/31	2026/04/10	2026/04/10	2026/04/10		100%	101%	25%
Design Review	0:19	0:21	7.6%	2026/03/31	2026/04/10	2026/04/10	2026/04/10		100%	110%	7.6%
Code	1:02	0:34	24.4%	2026/03/31	2026/04/12	2026/04/12	2026/04/12		100%	55%	24.4%
Code Review	0:17	0:20	6.7%	2026/03/31	2026/04/12	2026/04/12	2026/04/12		100%	118%	6.7%
Compile	0:02	0:03	0.7%	2026/03/31	2026/04/12	2026/04/12	2026/04/12		100%	163%	0.7%
Test	0:03	0:34	1.3%	2026/03/31	2026/04/13	2026/04/13	2026/04/13		100%	1,027%	1.3%
Postmortem	0:28	0:34	11%	2026/04/01	2026/04/13	2026/04/13	2026/04/13		100%	122%	11%

スケジュール

期間開始日	期間終了日	計画時間	累積計画時間	累積計画価値	実績時間	累積実績時間	獲得価値
2026/03/29	2026/03/30	2:00	2:00	23.3%	0:51	1:58	0%
2026/03/30	2026/03/31	2:00	4:00	89%	0:00	1:58	0%
2026/03/31	2026/04/01	0:13	4:13	100%	0:00	1:58	0%
2026/04/01	2026/04/02	0:00	4:13	100%	0:00	1:58	0%
2026/04/02	2026/04/03	1:00	5:13	100%	0:00	1:58	0%
2026/04/03	2026/04/04	0:00	5:13	100%	0:00	1:58	0%
2026/04/04	2026/04/05	2:00	7:13	100%	0:18	2:16	23.3%
2026/04/05	2026/04/06	2:00	9:13	100%	0:00	2:16	23.3%
2026/04/06	2026/04/07	2:00	11:13	100%	0:00	2:16	23.3%
2026/04/07	2026/04/08	2:00	13:13	100%	0:00	2:16	23.3%
2026/04/08	2026/04/09	1:00	14:13	100%	1:04	3:20	23.3%
2026/04/09	2026/04/10	0:00	14:13	100%	0:21	3:41	23.3%
2026/04/10	2026/04/11	2:00	16:13	100%	0:00	3:41	55.8%
2026/04/11	2026/04/12	2:00	18:13	100%	0:00	3:41	55.8%
2026/04/12	2026/04/12	1:00	19:13	100%	0:57	4:38	87.6%
2026/04/12	2026/04/13	2:00	21:13	100%	1:08	5:46	100%
